

下，建立成本會計制度，及針對目前會計制度可能的缺失及弊病，進行設計上之改善。

二、座談及深度訪談：由於沒有一套成本會計制度，能適用於所有的組織。而且，成本會計制度的設計與一個經濟個體的組織結構有密不可分的關係，應依各組織成員資訊需求，調整其制度。因此，本研究將透過對私立大專院校之會計人員、教育部主管部門及學者舉行座談會及作深入訪談，詳細了解各私立大學院校目前之會計制度之規定及現況、資訊需求者之需求、私立大專院校一般之組織結構、作業流程及相關人員作業上的問題及意見。此外，當初步的會計制度設計完成後，首先將送交各私立大專院校之會計人員、教育部主管部門及學者評估，再透過座談會及深入訪談，與其討論初步成本會計制度的可行性，其可能面臨的問題及其可能的解決方案，如此週而復始，直至成本會計制度具有高度的可行性為止。

## 第二節 研究進度

整個研究計畫將按照下列步驟進行：

- 一、蒐集私立大專院校現行之會計制度、法令規章及相關文獻。
- 二、以私立大學院校各學院為成本標的，根據現行之理論，評估現行之會計制度在估計各學院之成本時，所面臨的問題。
- 三、與私立大專院校會計人員、教育部主管部門及學者進行分區座談

及深度訪談。探討本研究小組，針對現行會計制度所提議之改善方向，間接成本分攤方式成本效益和可行性的問題。

四、綜合並分析上述座談及深度訪談之問題，設計私立大學院校成本會計制度基本架構。

五、期中簡報。

六、分別撰稿及完成整合。

七、與私立大專院校會計人員、教育部主管部門及學者進行分區座談及深度訪談，探討成本會計制度的適用性及可行性。

八、完成成本會計制度修訂，並提出建議。

九、舉行期末簡報。

十、對私立大學院校成本會計制度研究報告再修正。

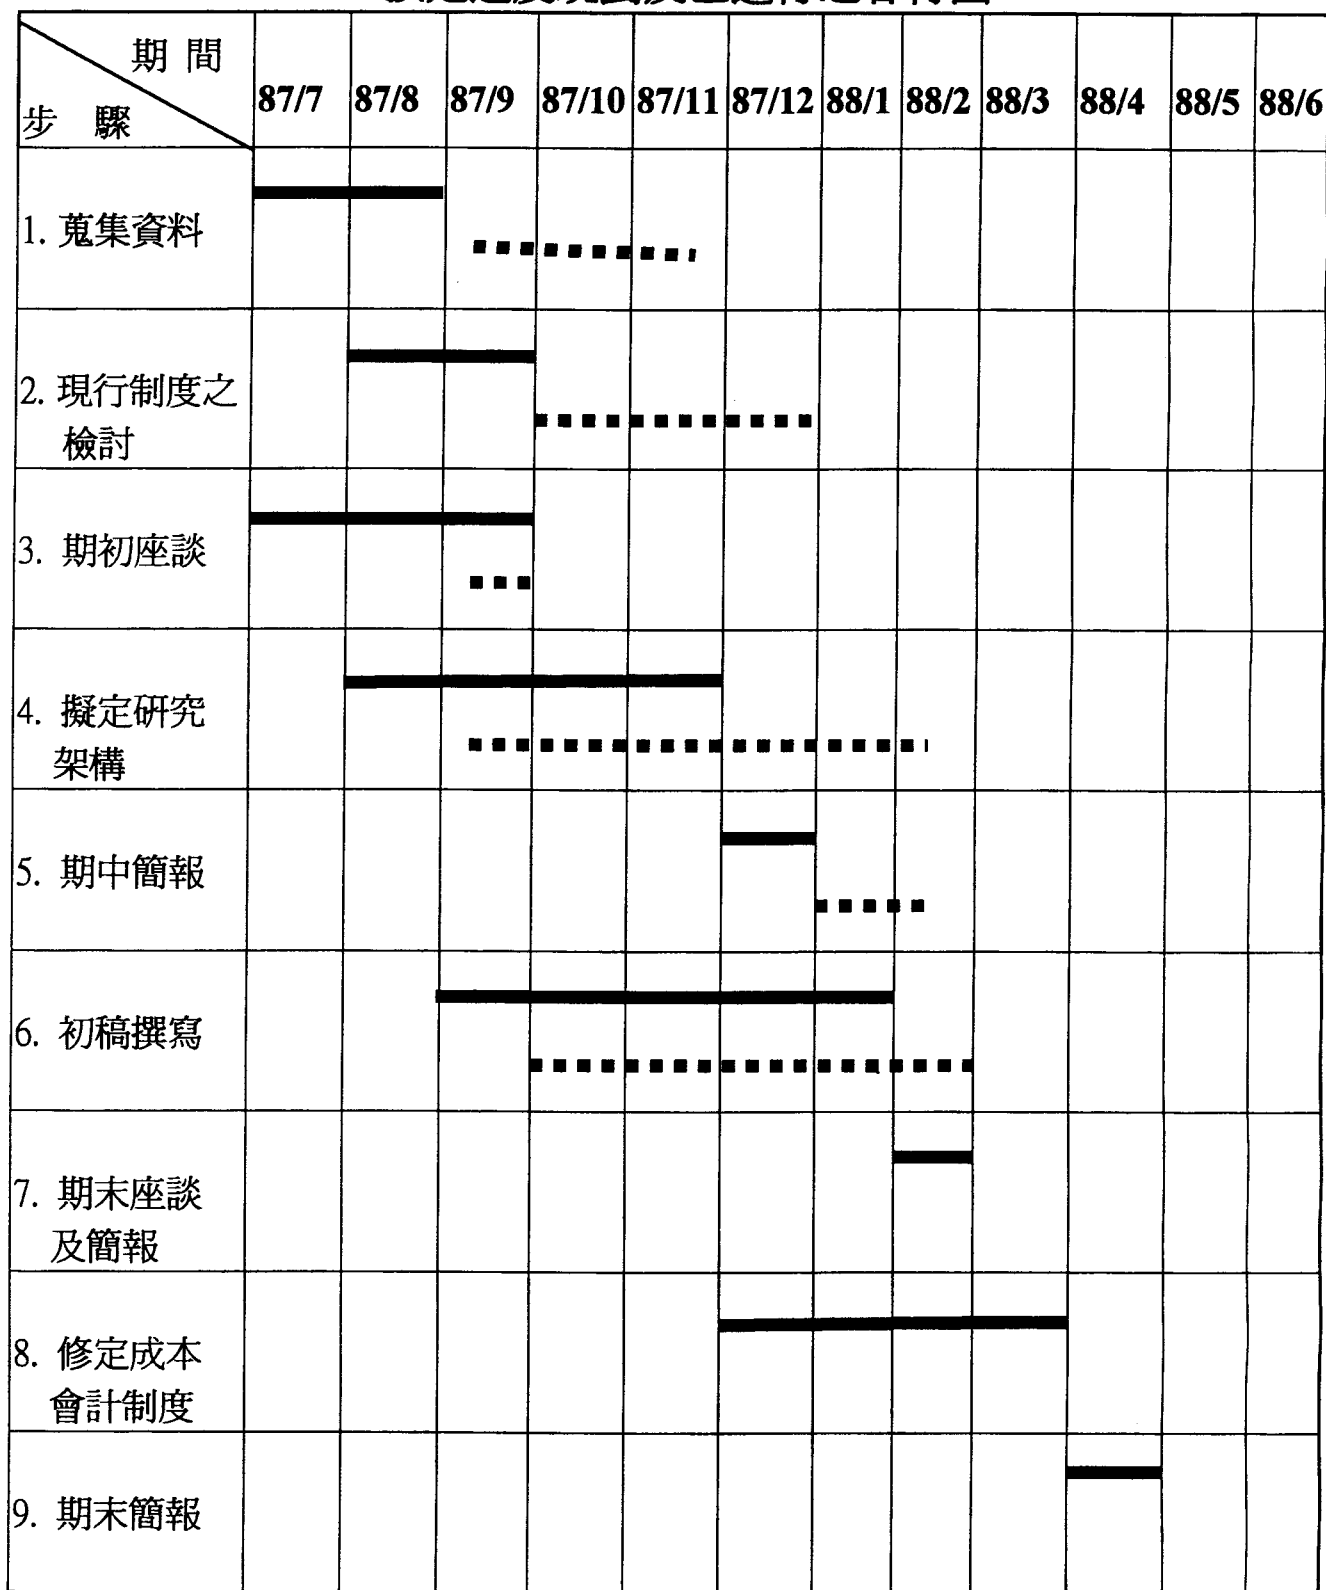
十一、完成研究報告打印完稿，送交教育部。



茲將上述研究步驟之預定進度及實際執行進度，以甘特條型圖表示圖一：


從甘特條型圖預計進度及實際進度表可知，本研究實際進度較預計進度落後近三個月，其主要原因如下：


1. 本研究與教育部完成簽約較預計時間延後近三個月。
2. 向私立大學院校蒐集會計制度相關資料時，會計人員多所保留，增加資料蒐集的困難度。
3. 在進行深度訪談時，時間安排不易，不容易協調出與受訪人共同的時間，因而延誤進度。

圖 一  
預定進度規劃及已進行之甘特圖



10. 成本會計 制度定稿											
11. 打印完 稿											

 代表預計進度

 代表實際進度

4. 期中簡報舉行的時間比預定時間延遲近五個月。
